



COLD ROOM REFRIGERATION

CRIOGE srl



MANUALE INSTALLAZIONE CELLE CON PAVIMENTO




MANUALE INSTALLAZIONE CELLE CON PAVIMENTO

INTRODUZIONE


L'installazione delle celle frigorifere HUSKY é una operazione agevole che non richiede mano d'opera particolarmente qualificata. Si tratta infatti, di una normale operazione di assemblaggio di elementi prefabbricati che non richiede alcun tipo di adattamento degli elementi prefabbricati, né l'impiego di utensili specifici ad eccezione della chiave di manovra dei ganci, fornita con la cella.

Per un'agevole esecuzione del montaggio, si consiglia di fare riferimento al disegno esecutivo allegato ai materiali necessari per il montaggio ed in particolare di procedere seguendo le fasi specificate nelle pagine seguenti.

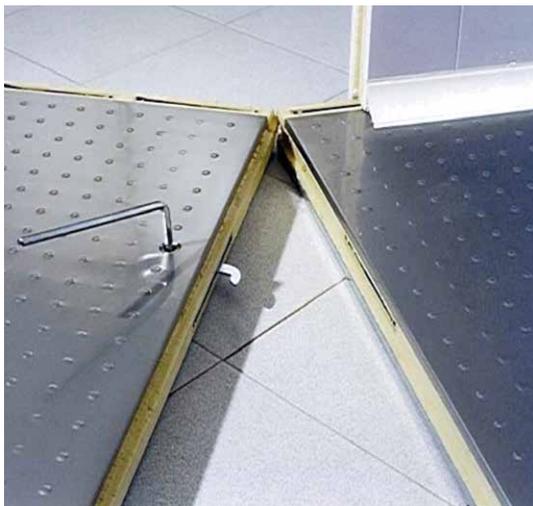


ATTENZIONE:

**I PANNELLI
DOVRANNO ESSERE
POSATI IN OPERA
CON L'ACCORTEZZA
CHE, CON VISTA
DALL'INTERNO DELLA
CELLA, LA LINEA DEI
FORI DEI GANCI DI
CIASCUN PANNELLO
SIA SEMPRE A DESTRA
RISPETTO AL PANNELLO
STESSO.**

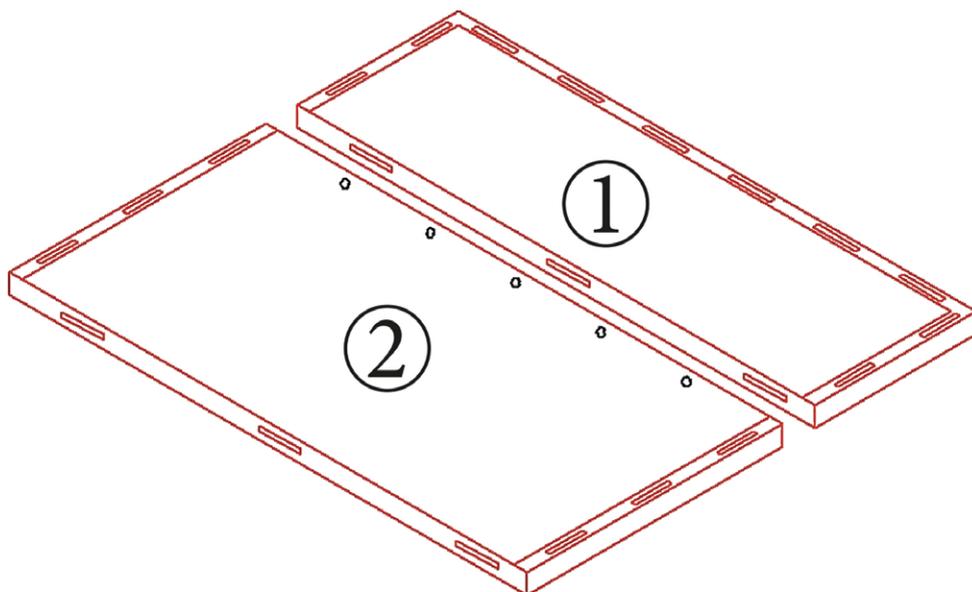


Dopo aver pulito e verificato la planarità e le pendenze del pavimento su cui installare la cella, posare i primi due pannelli, 1 e 2, del pavimento nella posizione voluta, come illustrato nella figura 1. Serrare a fondo i ganci di assemblaggio dei pannelli di pavimento.

ATTENZIONE: posando il pavimento contro pareti esistenti aver cura di lasciare uno spazio per la posa dei pannelli di parete di circa 20 mm. per le celle con spessore 70 mm. e di almeno 50 mm. per le celle con spessore 100 mm.

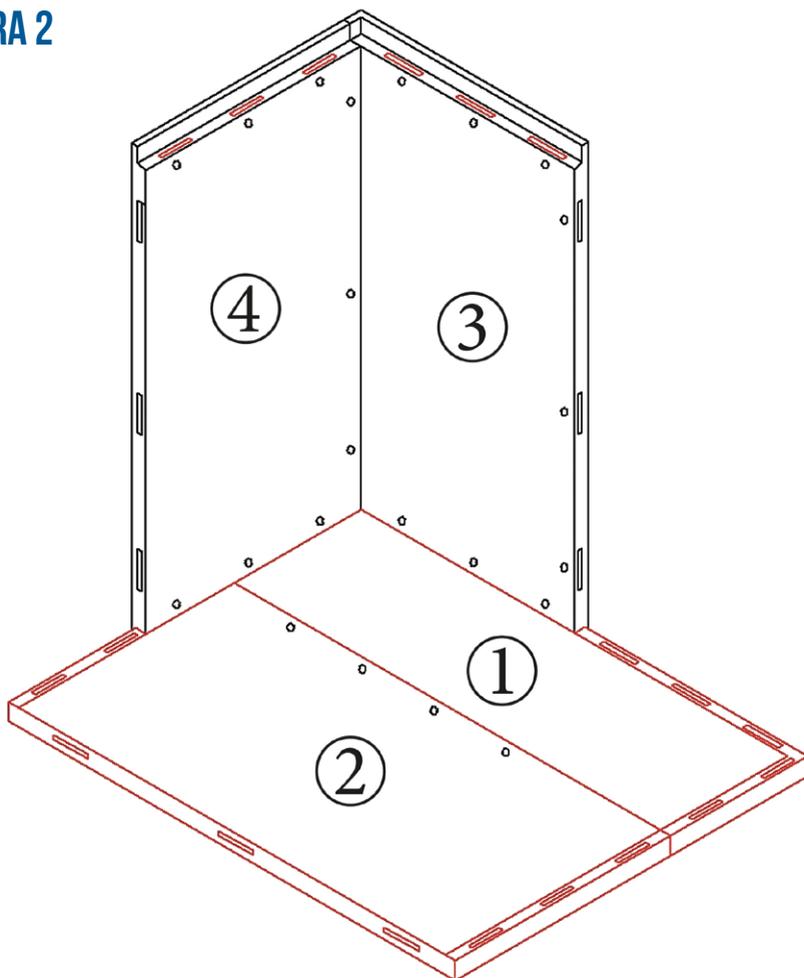


Posare un pannello angolo 3 ed un pannello di parete intermedio in corrispondenza di un angolo del pavimento (preferibilmente quello che poi sarà più difficilmente raggiungibile) avendo cura di utilizzare il pannello d'angolo e quello intermedio in accordo con il disegno esecutivo allegato alla cella. Si crea così un robusto caposaldo di riferimento.

ATTENZIONE: durante questa fase non serrare a fondo i ganci.

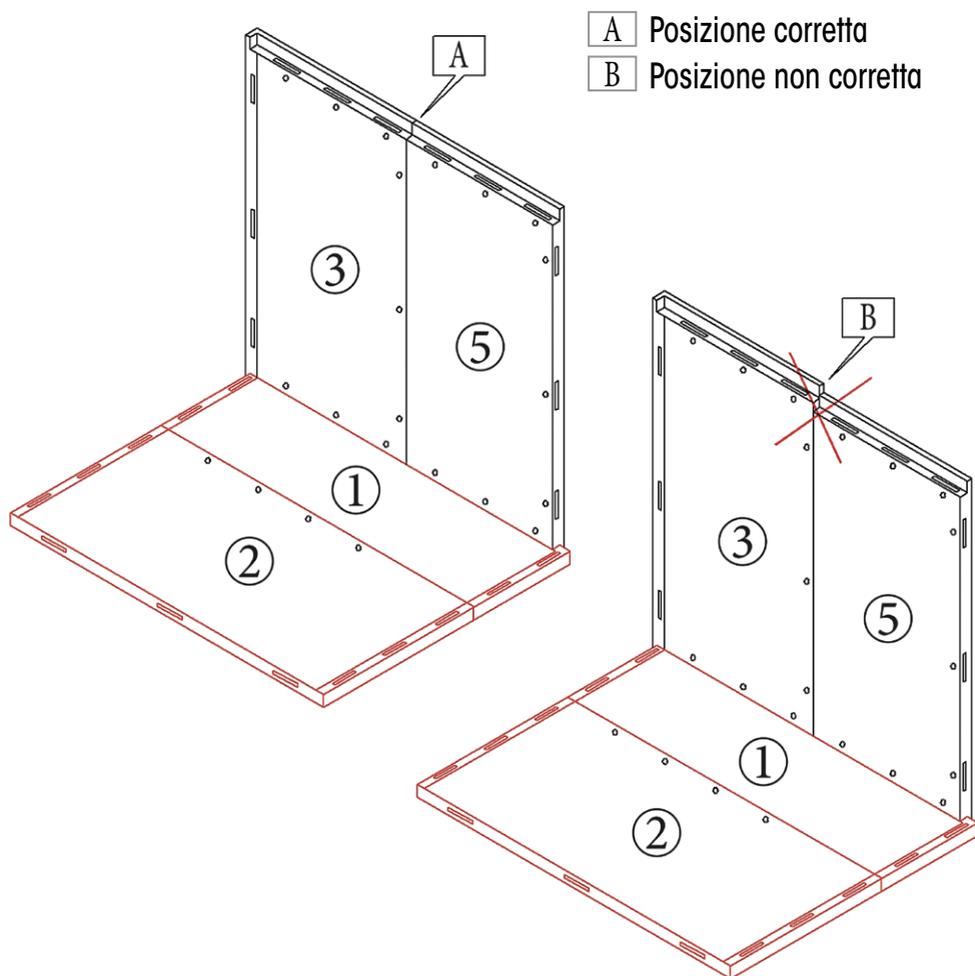

- A Posizione corretta
- B Posizione non corretta


Durante l'operazione di montaggio dei pannelli avere particolare cura nell'allineare tra di loro gli stessi. E' possibile che durante la fase di chiusura dei ganci i pannelli si muovano verticalmente uno rispetto all'altro; se ciò dovesse avvenire limitare il movimento dei pannelli avendo l'accortezza di verificare che i lati superiori risultino allineati tra di loro dopo aver stretto i ganci.

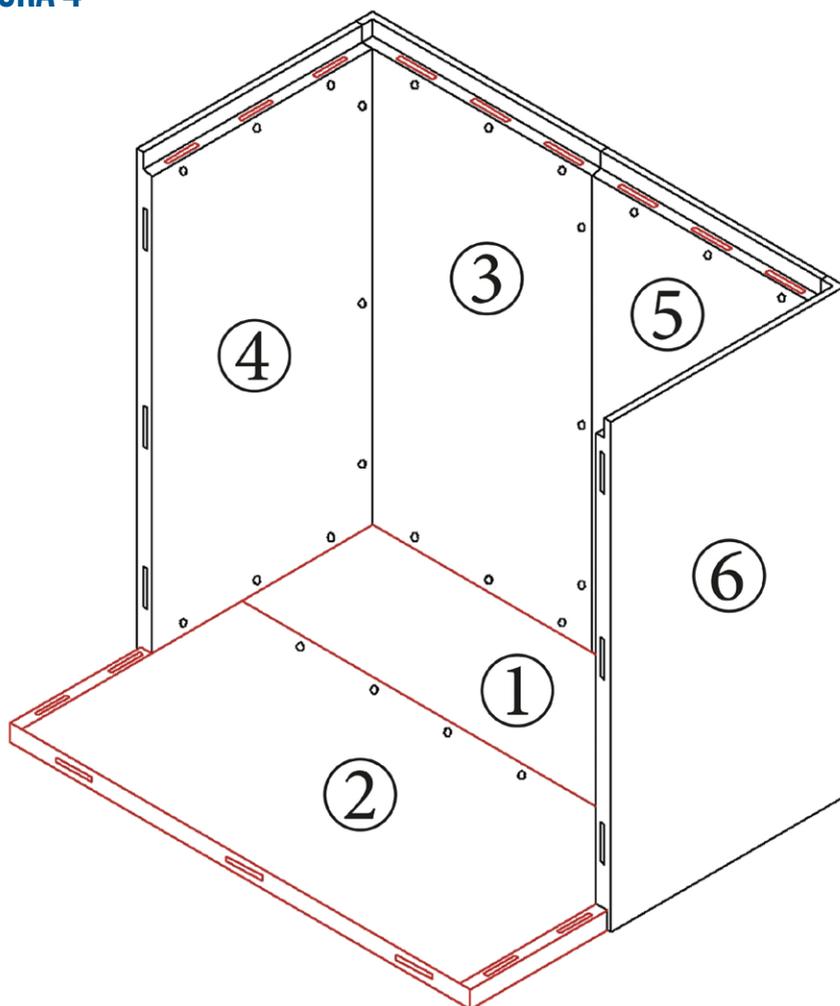

Proseguire con la posa dei pannelli di parete 5 e d'angolo 6, fino a completare una parete con l'angolo opposto al primo per consentire il montaggio del primo pannello di soffitto.


ATTENZIONE: rispettare sempre la sequenza dei pannelli come indicato nel disegno esecutivo allegato alla cella.

FIGURA 5

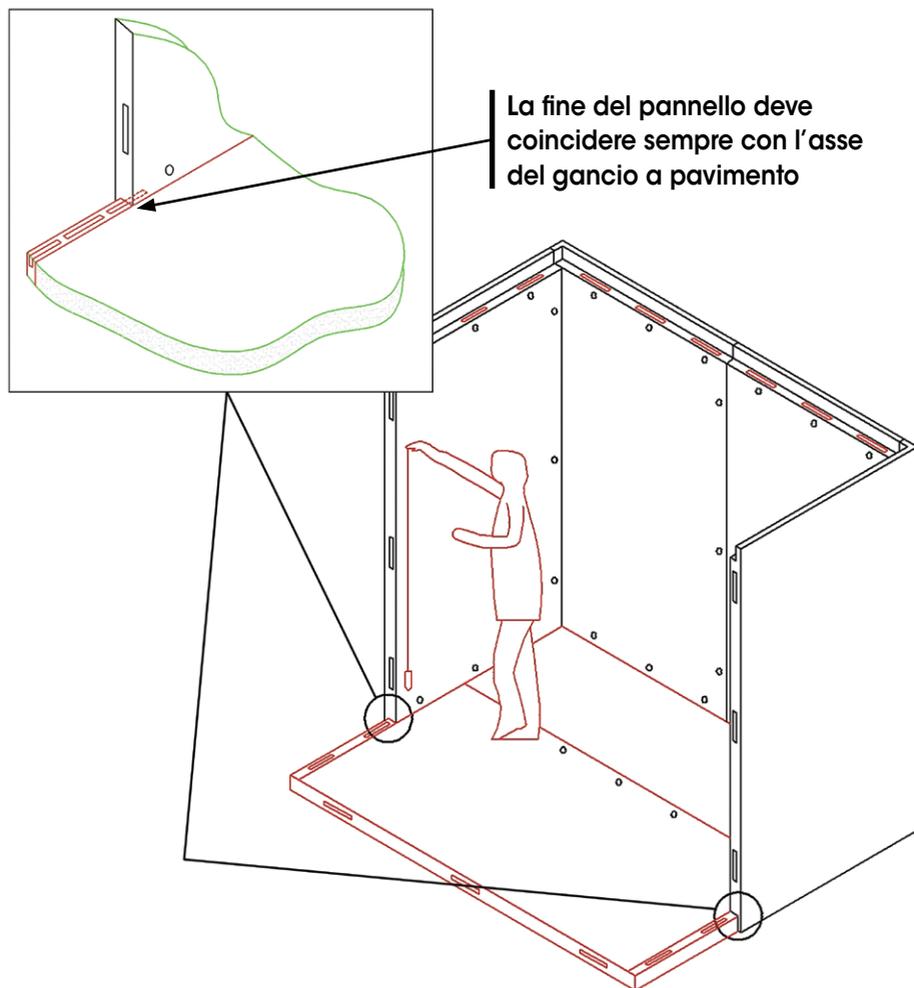


Durante la fase di posa dei pannelli di parete (intermedi o d'angolo) verificare che gli stessi siano "a piombo" e quindi serrare i ganci.


ATTENZIONE: A conferma di una corretta installazione si consiglia di verificare che la fine del pannello verticale coincida, sempre, con l'asse del gancio del pannello di pavimento come visualizzato nel dettaglio della figura 5.

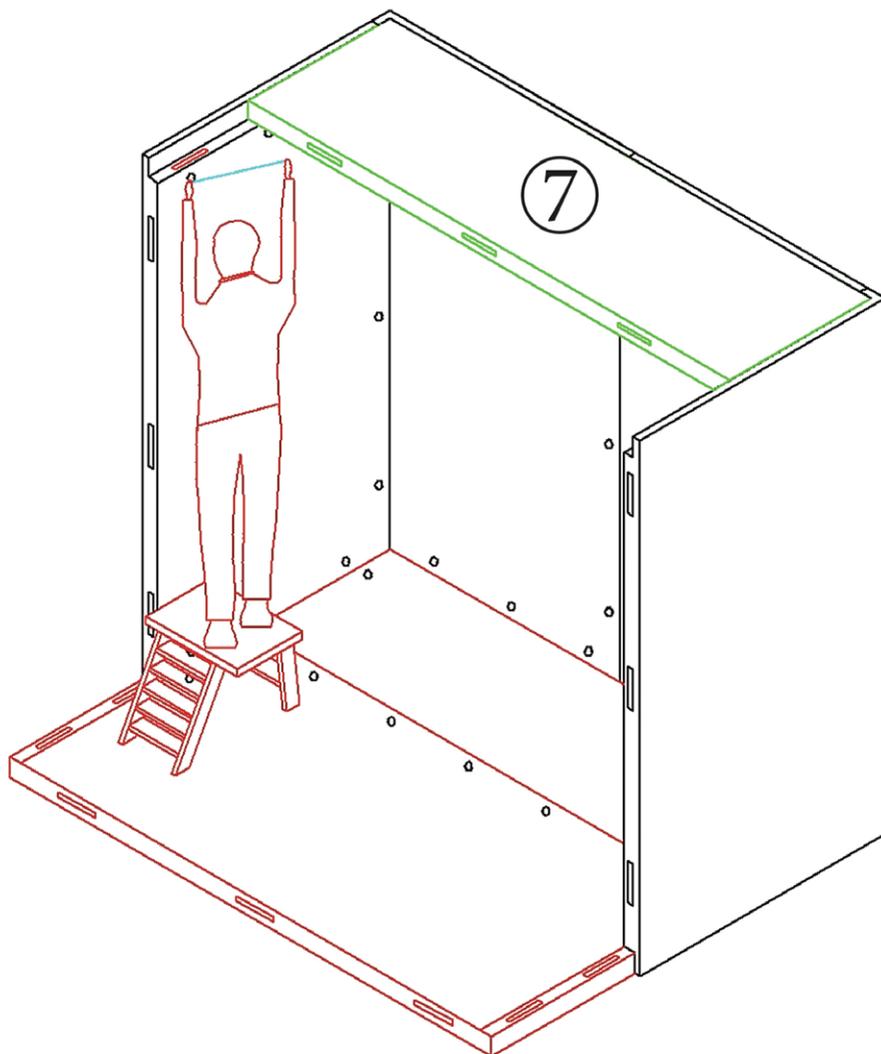


Posare il primo pannello di tetto (7) incastrandolo tra i "denti" dei pannelli di parete fintanto che appoggia sui pannelli stessi. Chiudere i ganci e verificare che la fine del pannello verticale e la fine del pannello di soffitto sia uguale a 200 mm.

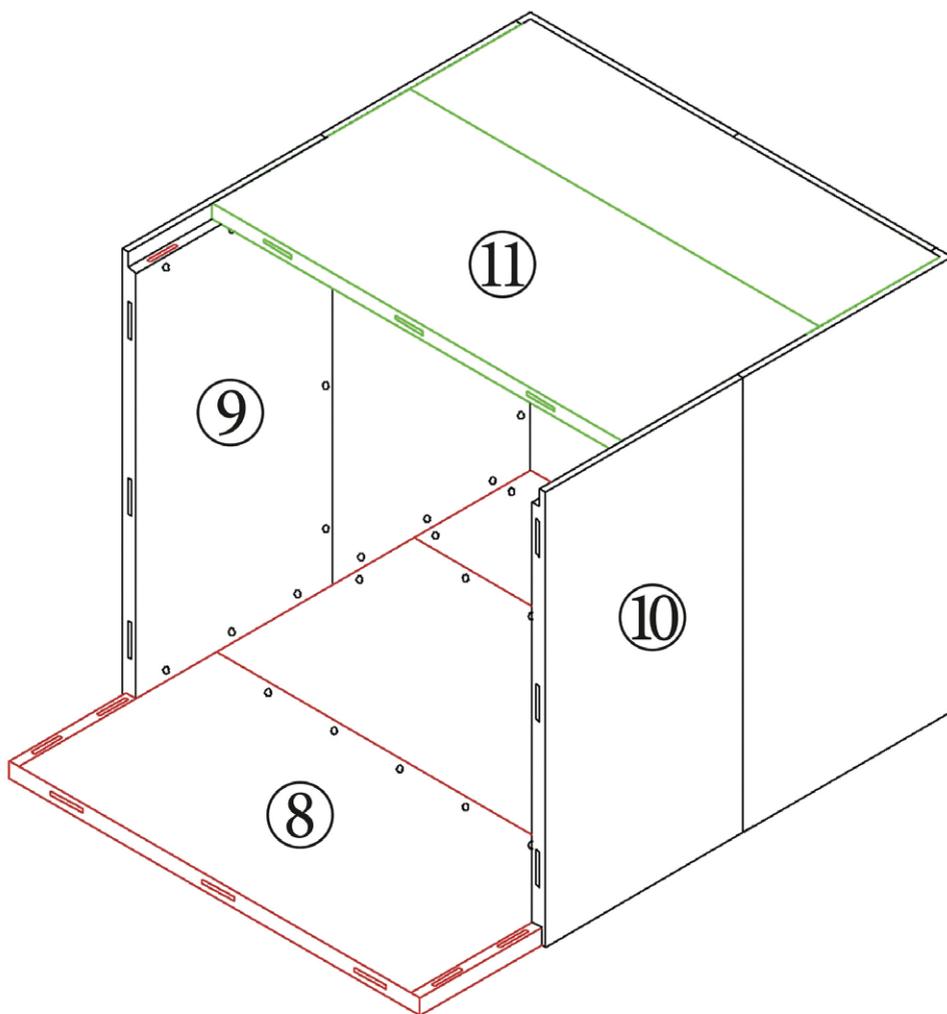


Procedere alla posa dei successivi pannelli avendo l'accortezza di rispettare sempre gli accorgimenti suggeriti in precedenza. Nella FIGURA 7 viene indicata la corretta sequenza di montaggio dei pannelli.

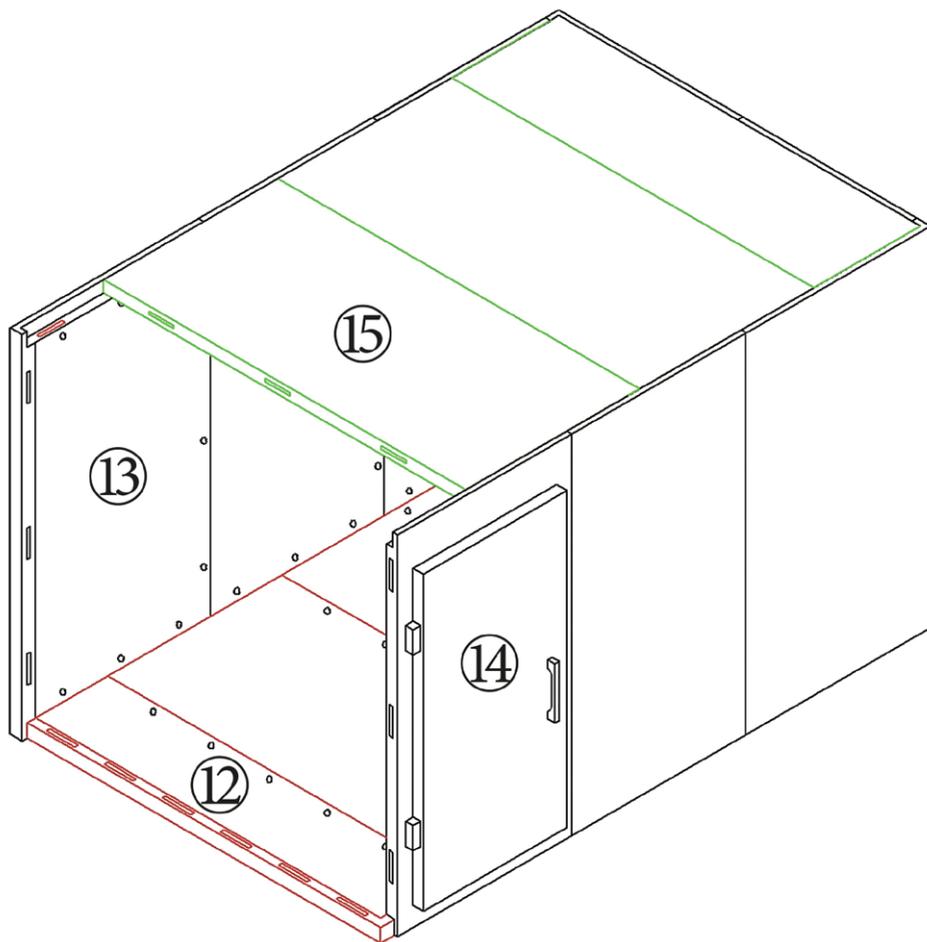

Proseguire nella posa dei pannelli seguendo la sequenza indicata nella FIGURA 8 fino a terminare i pannelli compreso il Vano Porta. La sequenza dimensionale dei pannelli è indicata nel disegno esecutivo che accompagna ciascuna cella. Rispettare questa sequenza al fine di poter montare il Vano Porta nella dimensione desiderata.

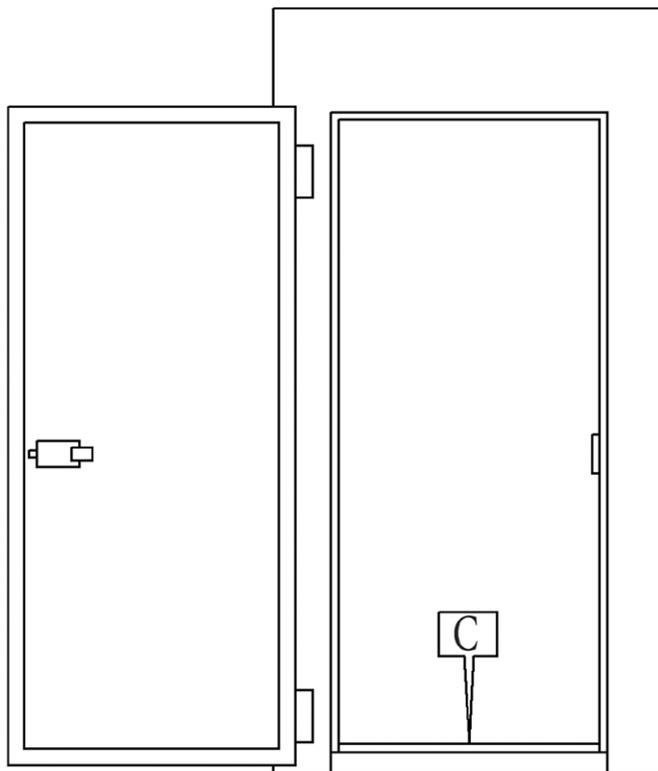
C Profilo angolare da togliere

Nel caso in cui la cela sia fornita di Vano Porta con porta su cardini premontata, prima della installazione del Vano Porta, togliere il profilo angolare situato nella parte inferiore del Vano Porta stesso (vedi targhetta adesiva sul profilo stesso). Questo profilo viene fornito per evitare danni al pannello Vano Porta durante il trasporto. Per smontare il profilo agire sulle quattro viti di fissaggio.

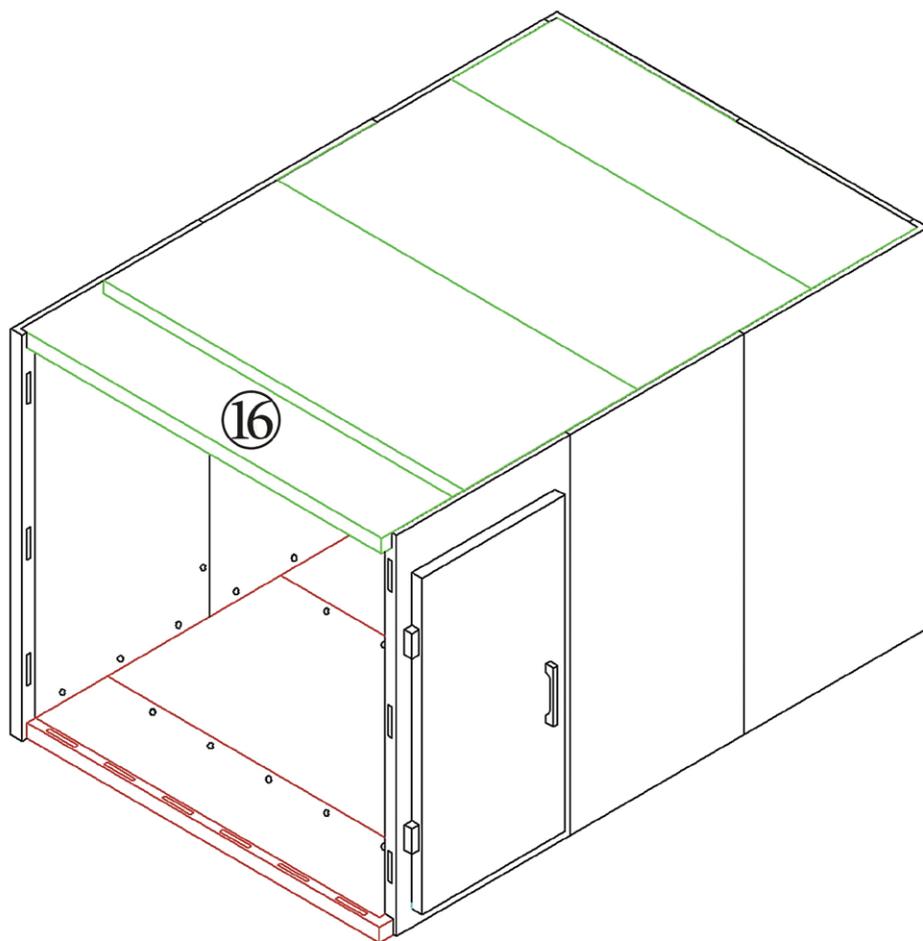

Posa in opera dell'ultimo pannello di soffitto.

ATTENZIONE: Durante tutte le operazioni fin qui descritte è meglio non serrare a fondo i ganci di connessione tra pareti e pavimenti e tra pareti e soffitto.

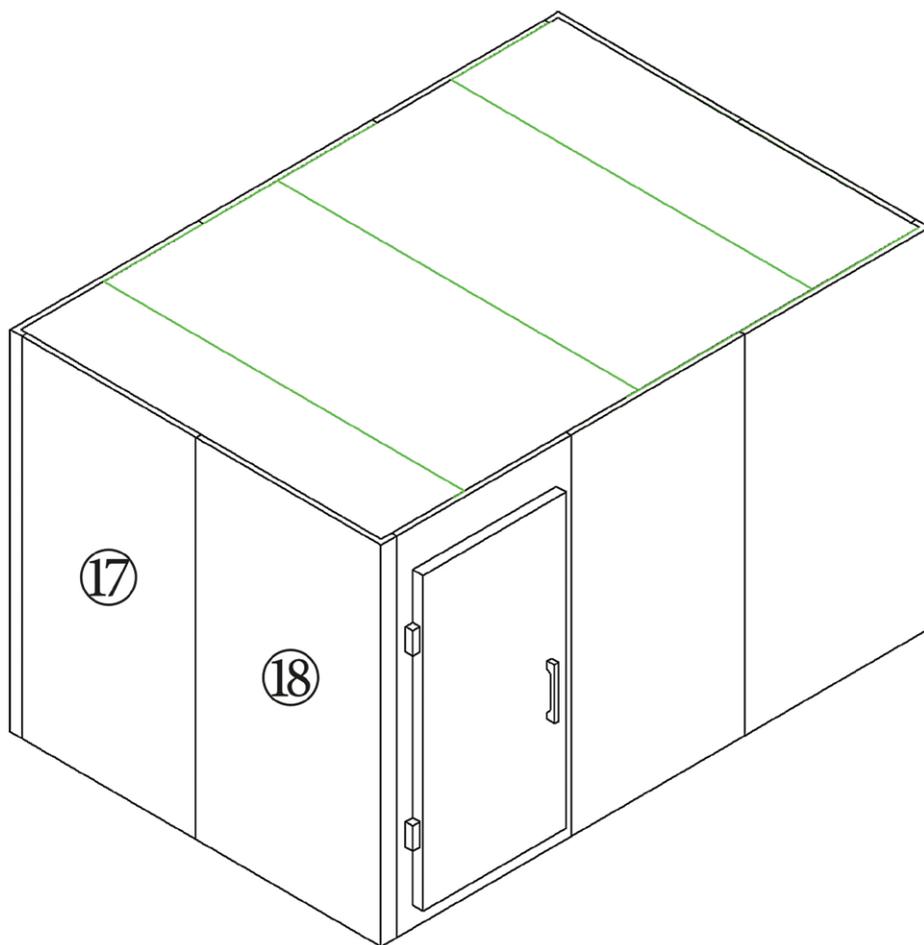

Terminare le operazioni di montaggio con la posa in opera dell'ultima parete..

Ad assemblaggio completato, verificare la correttezza dell'insieme ed iniziare a serrare a fondo i ganci, verificando che i pannelli si assestino correttamente tra di loro. Nelle celle con profilo sanitario standard prima di serrare a fondo i ganci tra parete e pavimento incastrare tra gli stessi il profilo prima di chiudere a fondo i ganci.

Dopo aver terminato il montaggio rimuovere la pellicola in PVC posta a protezione della lamiera interna del pavimento. E' necessario rimuovere tale protezione da tutte le superfici realizzate con lamiera in ACCIAIO INOX.

Terminata la rimozione delle pellicole di protezione posizionare i tappi di chiusura in corrispondenza dei fori di manovra dei ganci. I tappi vengono forniti grigi per le superfici in Acciaio Inox e bianchi per tutte le altre superfici.. Se la cella frigorifera deve essere posizionata all'aperto, verificare che sia riparata e protetta dal sole, dall'acqua e dalle avverse condizioni temporali.

PULIZIA DELLA CELLA

Completato l'assemblaggio della cella frigorifera, si raccomanda di pulire accuratamente le superfici prima del carico. Usare a questo fine "Protar-Pro N" o un detergente leggero con un panno morbido.

MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO

- Usare correttamente i prodotti per la pulizia (Seguire le istruzioni del produttore, usare detergente neutro in acqua calda, sciacquare a asciugare).
- Pulire immediatamente i prodotti versati.
- Verificare la giunzione tra i pannelli di pavimento
- Usare le soluzioni corrette
- Utilizzare carrelli con ruote leggere.
- Non usare prodotti per la pulizia abrasivi
- Non pulire il pavimento con macchinari a pressione.

CARICO DEL PAVIMENTO

- Concentrato su ruota gommata: max 250 Kg;
- Distribuito: max 1500 Kg/m²;
- Su scaffalatura: 400 Kg/25 mm².

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Non disperdere nell'ambiente e smaltire secondo le normative vigenti in ciascun paese.



Sede Legale: Piazza Mazzini 77 - 35138 Padova (PD)

Sede Operativa: Via Roma 75 - 31023 Resana (TV)

www.criogel.it - info@criogelsrl.com
